

工 事 写 真 集

設置者名

設置場所

写真（1）【着工前】

- ※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ
- ※ 施行位置及び全景が把握できること

㊦浄化槽設備士が写っている写真

工事業者名

浄化槽設備士名

平成 18 年改訂

写真（２）【砕石・栗石基礎工】

※ 基礎厚 150mm以上が確認できること

㊦ 目潰し材投入後、機械転圧状態の写真

㊦ 栗石基礎厚 150mm以上が確認できる写真
(スケールを入れること)

写真（３）【配筋工】ピッチと長さが確認できる写真

※ 配筋全景が確認できること

※ 鉄筋被り（スペンサー等）が確認できること

㊦ 全景が確認できる写真

㊦ 底版配筋ピッチの 200mm以内が確認できる写真

㊦ 上部車庫等の荷重がかかる場合はダブル筋の写真

写真（４）【コンクリート基礎工】（深さが分かるようスケールを入れること）

※ 全景及び基礎厚 100mm または 150mm 以上が確認できること

㊦ 上部荷重がかからない場合は基礎コンクリート厚が
100mm 以上の写真

㊦ 上部車庫等の荷重がかかる場合は基礎コンクリート
厚が 150mm 以上の写真

写真（５）【コンクリート打設状況】

※ 鉄筋が確認できること

㊦ コンクリート打設中の写真

写真（6－1）【据 付 工】

※ 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること

㊦ 浄化槽本体は全体と型式が確認でき、据付機械が写っている写真

写真（6－2）【据 付 工】

※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること

㊦ 浄化槽設備士が写っている写真

写真（7-1）【埋戻工】

- ※ 検測定規等において、一層の仕上厚が確認できること
但し、上記施工方法が困難な場合は、別途協議する

㊦ 全景が確認できる写真

㊦ 埋戻し材料が確認でき、突固め及び水締めをしている写真

写真（7-2）【埋戻工】

- ※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること

㊦ 全景が確認できる写真

写真（８－１）【上部スラブ配筋工】

- ※ 配筋全景が確認できること
- ※ 鉄筋被り（スペンサー等）が確認できること

㊦ 上部スラブ筋ピッチの200mm以内が確認できる写真
（スケールを入れること）

㊦ 上部車庫等の荷重がかかる場合はダブル筋の写真

写真（８－２）【上部スラブコンクリート工】（スケールを入れること）

- ※ 全景及びスラブ厚100mmまたは150mm以上が確認できること

㊦ 上部荷重がかからない場合は上部スラブ厚が100mm以上の写真

㊦ 上部車庫等の荷重がかかる場合は上部スラブ厚が150mm以上の写真

写真（9）【嵩上げ状況】

※ 嵩上げ高が確認できること

㊦概ね30cmまでが確認できる写真
(それ以上はピット構造とすること)

写真（10-1）【排水設備】

※ 配管及び柵設置状況

※ 管基礎と柵基礎が確認できること


㊦雨水管・足洗い場等の接続は認めない

㊦クラッシュラン等、柵の基礎が確認できる写真

㊦柵の基礎は5cm程度打設すること

写真（10－2）【排水設備】

- ※ 配管及び柵設置状況

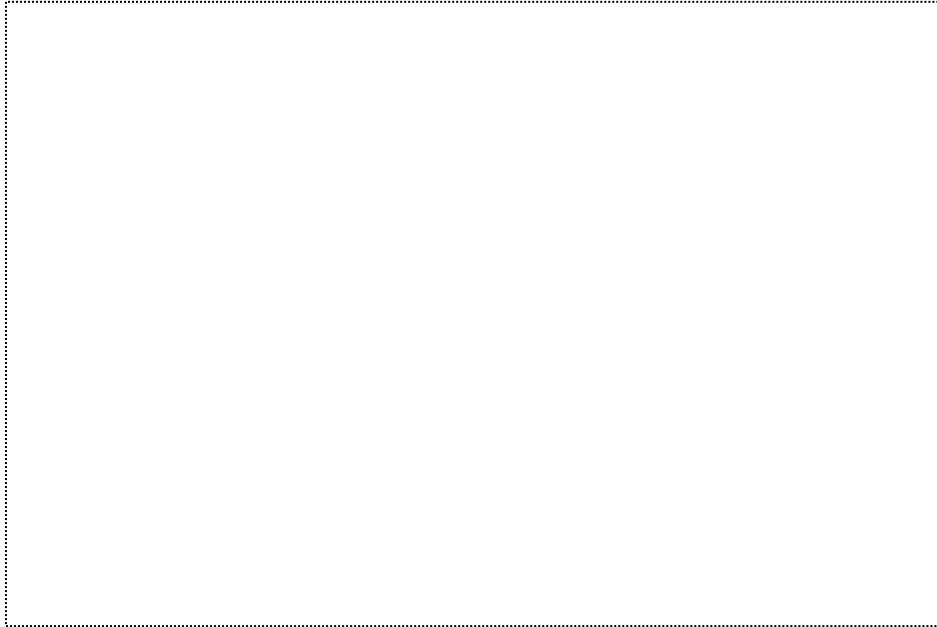

写真（10－3）【排水設備】

- ※ 配管及び柵設置状況
- ※ 全景が確認できること

㊦浄化槽本体の概ね1 m以内に流入及び放流柵を設置すること

写真（11）【ブロー設置状況】

- ※ 接地工事（アース）が必要な場合は、確認できること

Ⓢ配管の長さは10m以内とすること

写真（12）【竣工】

- ※ 浄化槽設備士が入っていること
- ※ 浄化槽設置が確認できること

Ⓢ配管状況・柵設置状況・浄化槽設置完了が明確なこと

写真（13-1）【柱筋】（※支柱工が必要な場合のみ）

※ 全本数（フープ筋含む）が確認できること

㊦支柱の本数

人槽	支柱本数
5～7	4本以上
8～10	6本以上

㊦紙筒などの支柱枠がない状態の写真

写真（13-2）【柱筋】（※支柱工が必要な場合のみ）

※ フープ筋ピッチが確認できること

㊦フープ筋のピッチは概ね150mmが確認できる写真

写真（14-1）【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真

項目：臭突管の状況

- ㊦臭突管が上部スラブ端まで配管されていることが確認できる写真

写真（14-2）【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真


項目：ポンプ槽の状況（※ポンプ槽設置の場合のみ）

- ㊦ポンプ槽が浄化槽本体と同一掘削地内の場合は、ポンプ槽が確認できる写真を添付すること
- ㊦浄化槽本体とポンプ槽が離れている場合は、全ての工事過程において浄化槽本体工事に準じ工事写真集を作成すること

写真（14-3）【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真

項目：

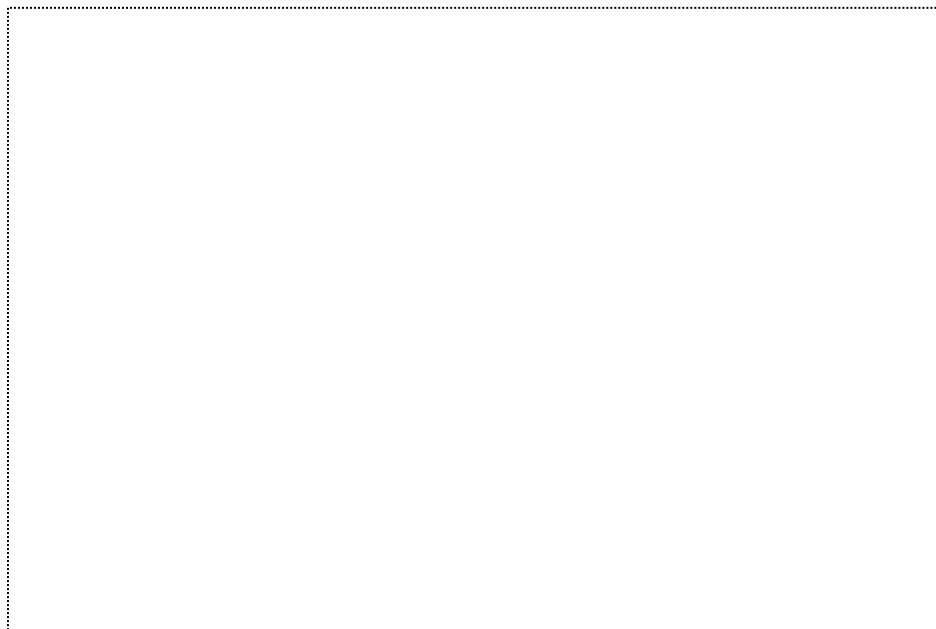

写真（14-4）【その他】

※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真

項目：

