令和8年11月17日

質 疑 回 答 書

工事名 ： 小郡市新体育館アリーナ棟建設工事

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
1	A-006	特記仕様書 第20章 47 家具に記載の展示ｹｰｽについて、図面及び内訳書に記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。 必要な場合、範囲・詳細等を御指示下さい。	宜しいです。
2	A-006	特記仕様書 第20章 49 電動間仕切について、「施工箇所:ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ」とありますが、図面及び内訳書に記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、範囲・納まりの詳細等を御指示下さい。	宜しいです。
3	A-006	特記仕様書 第20章 51 天井吸音ﾙｰﾊﾞｰについて、図面及び内訳書に記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。 必要な場合、範囲・納まりの詳細等を御指示下さい。	宜しいです。
4	A-007	特記仕様書 第20章 54 排煙ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄについて、図面及び内訳書に記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。 必要な場合、範囲・納まりの詳細等を御指示下さい。	宜しいです。
5	S-005 S-103 S-104	R1階X1通・X7通のSRC柱について、仕口部ﾌｰﾌﾟにﾌﾚｱ溶接が必要と思われますが、ﾌｰﾌﾟ1巻当たりの溶接か所はS-005図に倣い、4か所と考えて宜しいでしょうか。	図S-006に倣い4か所でよろしいです。
6	S-054	2階床梁伏図にて、X5～6通－Y1～2通間のｽﾗﾌﾞ天端が「－300」とありますが、凡例では「－250」と相違しています。凡例を正と考えて宜しいでしょうか。 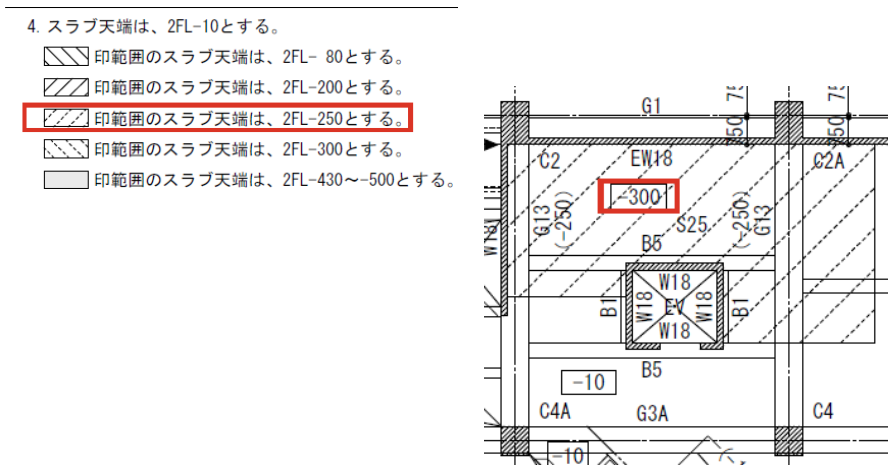	-300を正としてください。

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
7	S-159	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ配筋詳細図にて、「※印寸法は意匠図による」とありますが、意匠図では該当する範囲が見当たりません。不要と考えて宜しいでしょうか。 また、必要な場合は、範囲及び断面寸法を併せて御指示下さい。	宜しいです。
8	S-202	屋内階段(1)(2)詳細のb矢視図にて、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(2-M20 L=400 横向き)の施工ﾋﾟｯﾁは@600程度と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
9	S-202	屋外階段詳細のe矢視図にて、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(2-M20 L=400 横向き)の施工ﾋﾟｯﾁは@600程度と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
10	S-205 D-003 D-005 D-006 D-007	ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ上部のS造部分について、RCを巻いたS梁とRCを巻いていないS梁の使い分けが不明瞭です。御指示下さい。	天井面に見えてくるスラブがとりつくS梁は、すべてRC被覆と考えてください。
11	S-753	武道館側のPC緊張工事に伴い、ｱﾘｰﾅ側の2階ｽﾛｰﾌﾟを一部後施工とするように記載がありますが、範囲が不明瞭です。 具体的な範囲を御指示下さい。 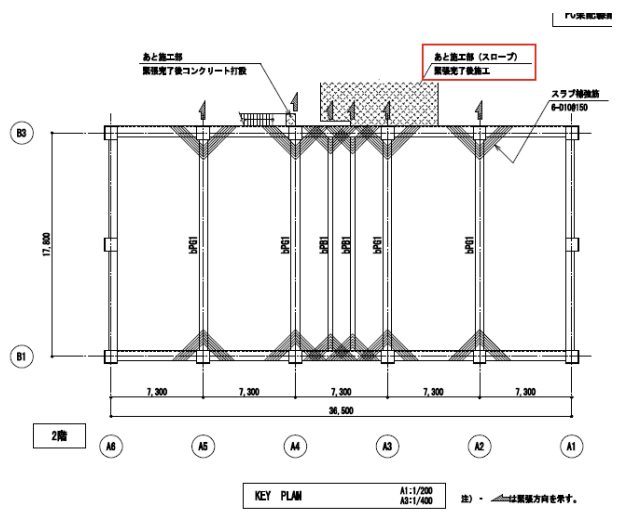	スロープを先に施工するとPC緊張工事が難しいと判断し、後施工と記載しています。 具体的な範囲は施工計画に合わせて判断いただき、監督員との協議のうえ決定します。
12	構造	建方計画について鉄骨柱梁のみでの建て逃げは耐力的に可能でしょうか。 RC打設後でなければ建方不可などの条件があればご指示ください。	建て逃げは可能ですが、S-251の特記事項4.に記載の通り、キールトラスのジャッキダウンはコンクリートの強度発現後に行う必要があり、RC打設後でなければ不可という条件となります。
13	E-030 E-033	照明器具について 授乳室(1-1)、みまもり室器具リストにG32Cと記載がありますが、姿図に記載がないため、G32と考えてよろしいでしょうか。	姿図のG32を正としてください。
14	E-030	照明器具について	姿図のBB16を正としてください。

No.	該当箇所 （図面番号）	質 問 事 項	回　　答
	E-034	全熱交換機置場（屋外）器具リストにBB16Wと記載がありますが、姿図に記載がないため、BB16と考えてよろしいでしょうか。	
15	M-01 特記仕様書（1） 第2編共通工事 第2章配管工事	（空調配管）冷温水（50A未満）の管財が金属強化ポリエチレン管となっていますが、積水化学工業のエスロンスーパーエスロメタックスは、2026年8月末日にてパイプの受注登録終了、2027年9月末でパイプ、継手、工具の全製品販売終了となっています。 他社に同等品無く、どの管財にて代替とすればよろしいでしょうか。	25AまではCK金属とし、30A,40Aの屋内一般配管については、50Aの空調用高性能ポリエチレン管に変更してください。（保温共）
